

Referenz:

PapierfabrikTornesch
RückbauBr. III und IV



Bauherr: *Papierfabrik Tornesch*

Ort: Tornesch

Kostenstelle: 29950

Gebirgsformation: Lockerformationen

Bohrverfahren: Schußperforation, Verpressung



Anzahl Bohrungen: 2

Bohrtiefe in m: 233,5

Bohrmeter gesamt: 469,5

Bohr-Ø in mm: Br. III - 480/800


Br. IV - 650/450

Ausbaudaten: Br. III -368St/200Obo

Br. IV -250/150/KV/E

Zweck der Bohrung:

Rückbau Brunnen III und IV für die
Papierfabrik Werk Tornesch.

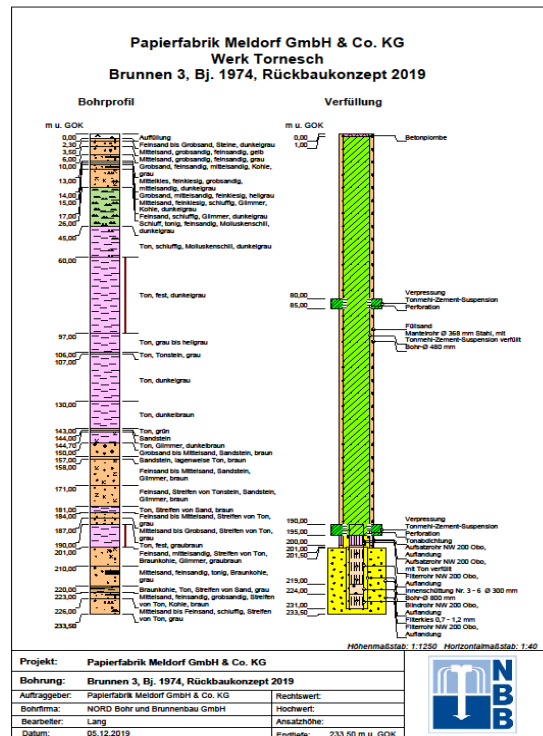

Zusätzliche Erklärungen:

Nach Fertigstellung des Br. 6 wurden die beiden Altbrunnen III und IV zurückgebaut. Da die Hinterfüllung des Br. III unbekannt war, wurde das Mantelrohr 368 mm Ø zwischen 80,00 und 85,00 m sowie 190,00 und 195,00 m mittels Schußtechnik perforiert. Nach Verfüllung der Filterstrecke mit Filterkies wurden die Stahlrohre mit einer Tonmehl-Zement-Suspension von 195,00 m bis GOK aufgefüllt und über den Brunnenkopf in den Ringraum verpresst. Da beim Br. IV der gesamte Ringraum im Bereich der Vollrohre verpresst war, wurde der Brunnenbau nur mit einer Tonmehl-Zement-Suspension aufgefüllt.



NORD BOHR UND BRUNNENBAU GmbH
Randersweide 1
D 21035 Hamburg
Fon +49 40 735 956-30
Fax +49 40 735 956-40
info@nord-bb.de | www.nord-bb.de

Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Sven Tewes
AG Hamburg HRB 86098
FA HH-Bergedorf
St.-Nr. 44/747/00114
Ust.-IdNr. DE 223590346

HypoVereinsbank
IBAN DE78 20030000 0000 334920
BIC HYVDEM3300
Commerzbank AG
IBAN DE30 20040000 0124 212200
BIC COBADEFFXXX
